



①	タイトル：立坑下リアルタイムモニター			
工事概要	発注者	工種	工事の種類	工事場所等
	東京都下水道局	推進	市街地	東京都練馬区南大泉
実際工期	平成27年11月5日～平成28年7月12日			
対策の背景目的	立坑下を通行者が立ち止って覗き込み事が多かったので、作業基地端部に立坑下の作業状況が見れるようにモニターを設置し、一般者に工事全般の紹介理解を求めるのが目的			
対策概要	立坑下、場内にWEBカメラを設置し、無線にて作業状況をモニター表示及び事務所の職員パソコンに同様に画像転送			

実施事項	説明内容
------	------

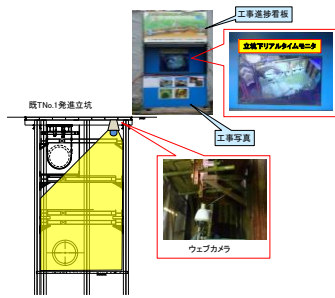

ウェブカメラ(坑内)

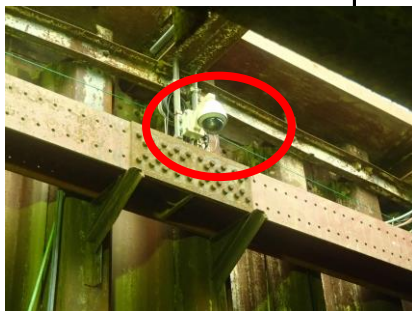

ウェブカメラ(基地)



立坑下モニター



効果	元請職員が作業員の動きを把握する上でも効果があり、対外的に第三者に見せる意味でもいいイメージUP効果を発揮していると思う。

反省点 今後の課題 特記事項	在来よりある”見せ方”であるが、決して高いものではないで、
	宅造現場でも採用できると思われる。
