

海底均し出来高管理シート

チーム	潜水士	送気員	連絡員
1			
2			

支柱番号 #482 測定日 11月24日

1.事前 高さデータ(AP+ m)

羽田

11月23日 (前日データ)

1.16	4	-1.75	-1.20	-0.70	-0.80	-0.95
1.8	3	-1.40	-0.95	-0.75	-0.60	-0.70
1.8	2	-1.50	-0.95	-0.70	-0.60	-0.40
1.16	1	-2.00	-1.00	-0.70	-0.95	-1.15
		A	B	C	D	E
		1.16	1.8	1.8	1.8	1.16

海側

山側

土量(m³)

羽田

目標高さ -1.70

1.16	4	-0.067	1.044	2.088	1.879	1.009	5.95
1.8	3	0.626	2.430	3.078	3.564	2.088	11.79
1.8	2	0.418	2.430	3.240	3.564	2.714	12.37
1.16	1	-0.404	1.462	2.088	1.566	0.740	5.45
m		A	B	C	D	E	合計
スパン長	m	1.16	1.8	1.8	1.8	1.16	35.52

海側

山側

2.事後 高さデータ(AP+ m)

羽田

11月24日 (当日データ)

1.16	4	-1.80	-1.50	-0.70	-0.80	-0.95
1.8	3	-1.50	-1.30	-0.75	-0.60	-0.70
1.8	2	-1.50	-0.95	-0.70	-0.60	-0.40
1.16	1	-2.00	-1.00	-0.70	-0.95	-1.15
		A	B	C	D	E
		1.16	1.8	1.8	1.8	1.16

海側

山側

土量(m³)

羽田

目標高さ -1.70

1.16	4	-0.135	0.418	2.088	1.879	1.009	5.26
1.8	3	0.418	1.296	3.078	3.564	2.088	10.44
1.8	2	0.418	2.430	3.240	3.564	2.714	12.37
1.16	1	-0.404	1.462	2.088	1.566	0.740	5.45
m		A	B	C	D	E	合計
スパン長	m	1.16	1.8	1.8	1.8	1.16	33.52

海側

山側

3.出来高 高さデータ(AP+ m)

羽田

1.16	4	0.05	0.30	0.00	0.00	0.00
1.8	3	0.10	0.35	0.00	0.00	0.00
1.8	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.16	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	B	C	D	E
		1.16	1.8	1.8	1.8	1.16

海側

山側


土量(m³)

羽田

1.16	4	0.067	0.626	0.000	0.000	0.000	0.69
1.8	3	0.209	1.134	0.000	0.000	0.000	1.34
1.8	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
1.16	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
m		A	B	C	D	E	合計
スパン長	m	1.16	1.8	1.8	1.8	1.16	2.04

海側

山側

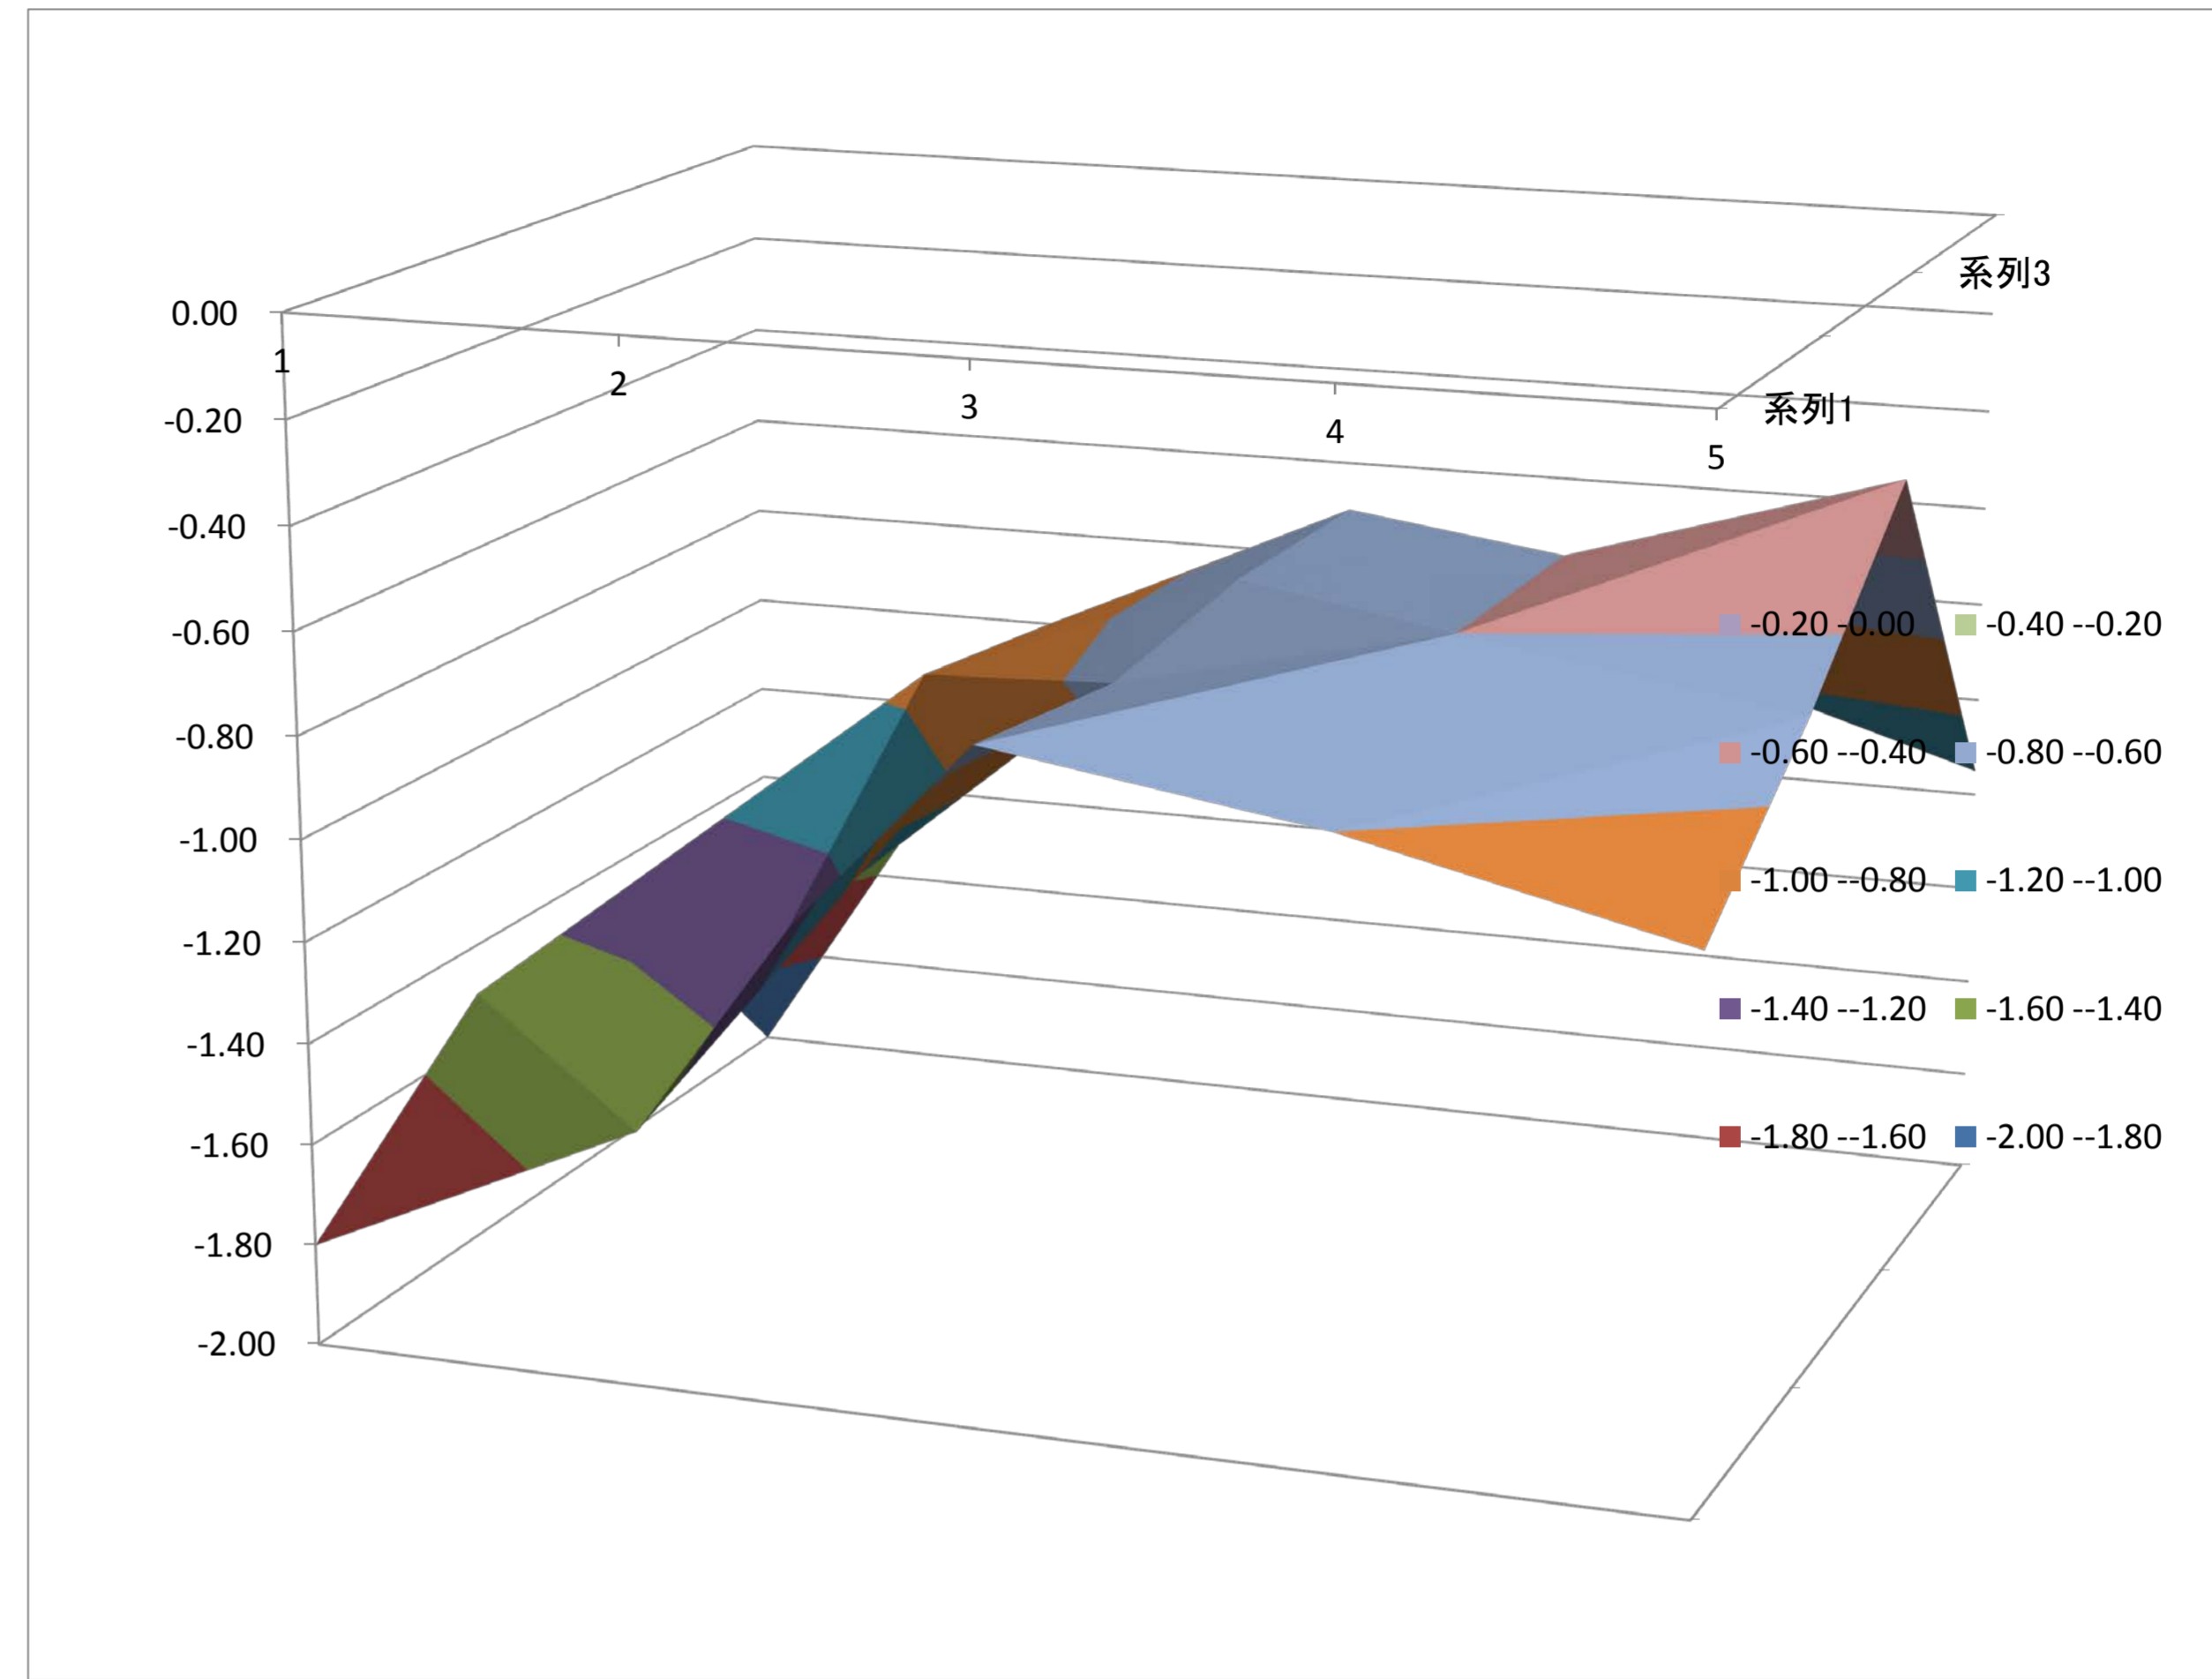

#482

