




【朝礼・KYB】

作業員が当日の作業が判りやすい様、絵や図を使った朝礼・KYBに努め、作業所の活性化を図っている。



【仮囲いへの思いやり①】

仮囲い掲示を仮囲いゲートに寄せることで、第三者通行人の視認性を高めている。また、ゲート近傍で仮囲いを一部折り込むことで、視認性を高める工夫を行っている。

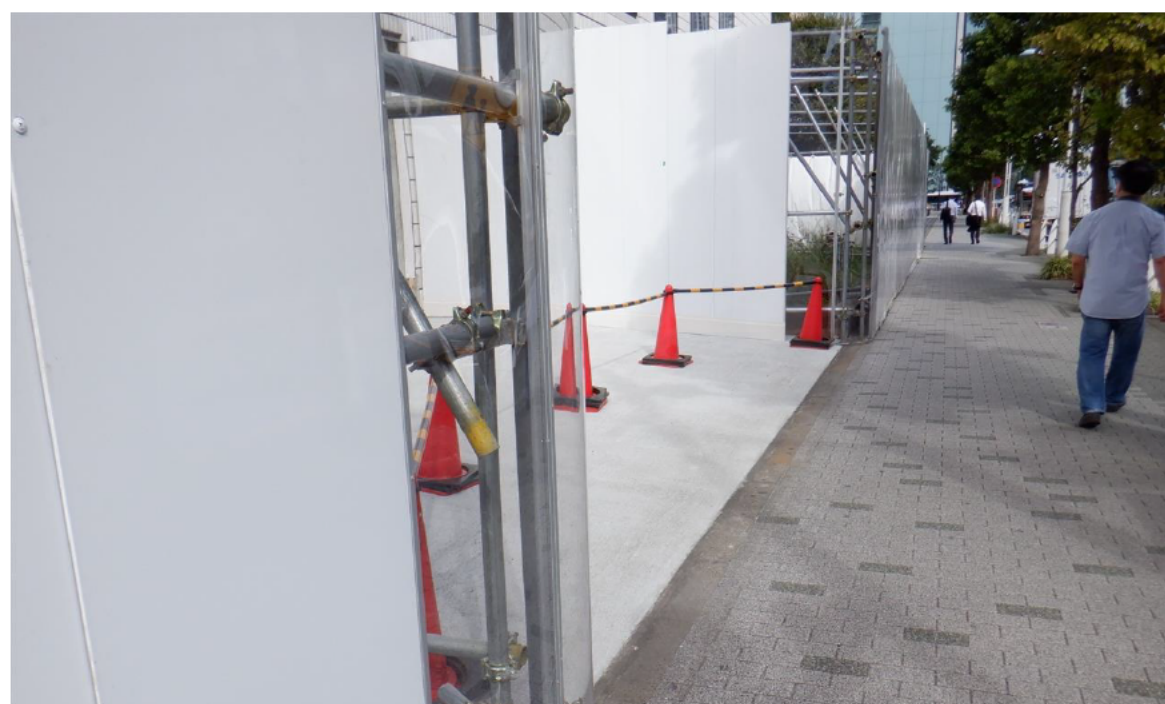


【仮囲いへの思いやり②】

仮囲いのコーナーに透明パネルを使用。お客様出入り時の視認性を高め、第三者通行人との接触防止を図るよう工夫した。



【研り/解体作業時の騒音測定】

現場近隣での暗騒音及び騒音発生状況を測定。画像に測定結果を表示させ、わかりやすく記録した。

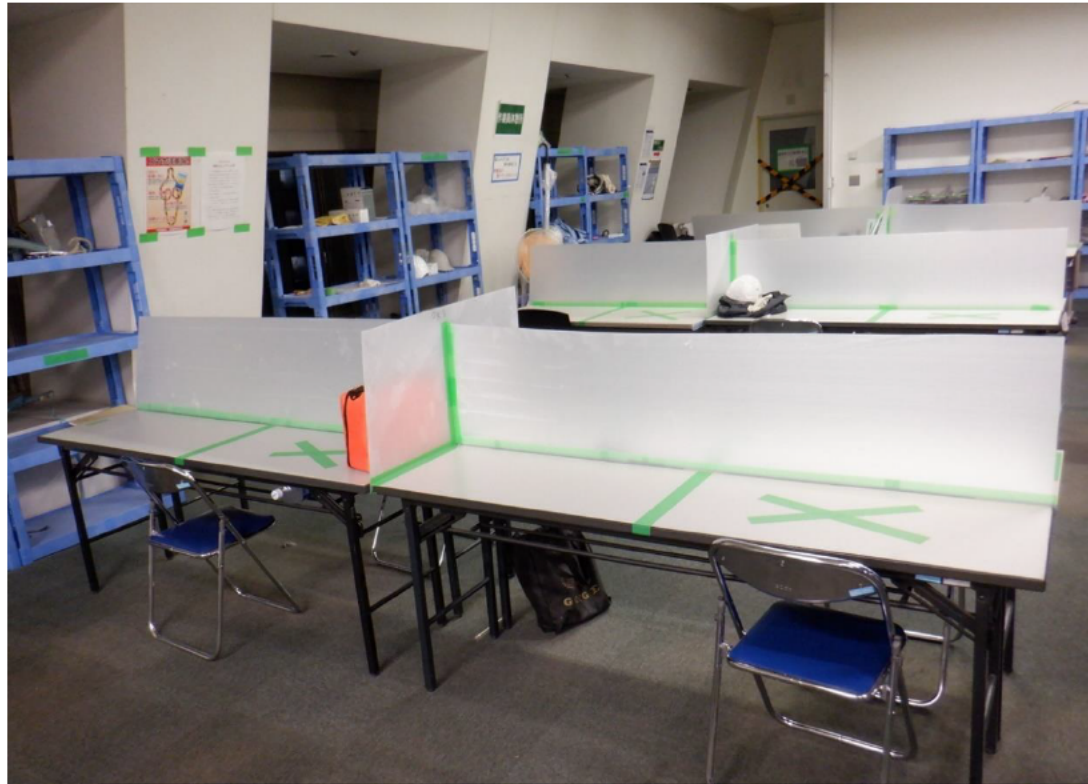

【作業員休憩所】
コロナ対策/ソーシャルディスタンス確保の為、
衝立設置・椅子間引き・×表示実施。



【脚立単独使用許可】
昼礼会場に脚立用POPを掲示、脚立使用許可について
現物を用いて説明実施。



【床養生に伴う下地段差部マーキング】
床に段差がある箇所における作業時、シート養生後に
下地段差箇所（立ち馬設置不可）をテープで明示した。



【視認性を確保した作業エリアの設定】
内装工事において、清掃の簡易化、視認性を確保しやすい様に
作業エリアはブルーシートを設置し、判りやすさに努めた。
