

□日々の安全施工サイクルを確実に回す ～担当者の明確化とRA作業手順書のフラッシュアップ①～

決心せよ！今日一日の無災害
ひとつひとつ心を込めた物づくり

協力会社名	職種	8/31 (月) 作業場所・ 作業内容[実施]	作業手順 書の有無	元請担 当者	元請指示事項	人員	
						予定 (合計)	実績 (合計)
	墨出し工						
	断熱工	2階/ウレタン吹付け	断熱-①		機器等の始 業前点検を 実施の上作 業を行う事	2 (2)	2 (2)
		ール吹付	耐火被覆 吹付		ブルーシー トで養生し てため足 元の資材を 定格荷重 80%を遵守 してくださ い	3 (3)	3 (3)
		敷設	揚重作業 1		薄暗い中 での作業に なるので、 照度確保す る	1 (1)	1 (1)
	取設設備 工		屋内配管 (SGP)		高車の使用 ルールを遵 守すること	4 (4)	4 (4)
	軽鉄・ボ ード工	新診療棟3階/LGS建て 込み、ボード貼り	壁下地、 高車、ボ ード		他職の作業 エリアに近 づく際は一 声かけ	4 (22)	4 (21)
	軽鉄・ボ ード工	新診療棟2階/LGS建て 込み、ボード貼り	壁下地、 高車、ボ ード		作業ラップ 時の一声か け徹底	5	5
	軽鉄・ボ ード工	新診療棟1階/LGS建て 込み、ボード貼り	壁下地、 高車、ボ ード			13	12

元請の担当者名
作業手順書の管理No
元請からの安全指示事項



作業間連絡調整会議の記入項目

担当者による現地KY及びRA作業手順書の確認

※作業手順書の管理No, 元請の担当者名, 元請安全指示事項を作業間連絡調整に記載する事で、担当者や作業手順書の有無を明確化する👁️

※連絡調整会議担当者に任命する事で、責任感を持ち、担当工種の安全管理！現地で作業手順書と実作業を照合し、異なる場合は、躊躇なく是正させる👉

一声をかけて摘み取る危険の芽 「起こる前に怒れ!!!」

IX. その他の危険有害性情報の「見える化」

日々の安全施工サイクルを確実に回す ～今日、私はこれを守る！「88の誓い」～

決心せよ！今日一日の無災害
ひとつひとつ心を込めた物づくり

作成：2021.05.31

「88の誓い」(安全宣言リスト)

土木・建築共通	1. 足場上作業>上下作業は絶対しません	杭打 重機 作業	45. 敷き鉄板養生を必ず行います	
	2. <クレーン作業>大きな声で3・3・3運動を実施します		46. リーダー昇降時はハーネス型安全帯を使用します	
	3. <重機作業>パー・チョキ・グーを必ず行います		47. バックホー新ルールを守ります	
	4. <各種作業>保護メガネを必ず着用します		48. 重機の作業半徑に立入禁止の表示をします	
	5. <インテュアー・スポット作業>作業手順の視覚しをします		49. 重機の荷降時はバケットを下し、必ず鍵を抜きます	
	6. <高中位>早めの休憩と小まめな水分補給を行います		50. 重機の用途外使用は絶対しません	
	7. <化学物質>材料のSDSとJIS規格のラベルを掲示します		51. フームの下に人を絶対入れません	
	8. RA手順書と手順書番号を必ず守って作業します		52. 配管交換時はエア抜きを必ず行います	
	9. 脚立の単独使用は絶対しません		クレーン 作業	53. A計測機は手順書を遵守し、使用ルールを守ります (測定使用前、使用開始・終業年月表示を必ず使用)
	10. 床端部・開口部では背を向けません			54. クレーン周囲の二重区画の立入禁止表示を行います
11. RA手順書と違う作業や危険作業時は、作業を中断します	55. 吊り荷の下の人払いを必ず行います			
12. 現場の整理整頓を必ず行います	56. 玉掛け用具の点検を必ず行います			
13. 一作業一片付を徹底します	57. 3・3・3運動が聞こえなければ吊りません			
14. 立入禁止場所には絶対入りません	58. 定格荷重80%以下で作業します			
15. 現場では元気で活発に声掛けします	59. アウトリフは完全張出しとします			
16. 風所では必ずハーネス型安全帯を使います	60. コニックでは前方吊をしません			
17. はしごでの作業は絶対しません	溶接・溶断 サンダー	61. フォルダーに溶接棒を付けたままにしません		
18. 風所では落下防止ストラップを使用します		62. 溶接作業前に必ず可燃物を除去します		
19. 台車の使用ルールを遵守します		63. 消火用水、消火器を必ず設置します		
20. 足場の上に資材を放置しません		64. 溶接時は溶接ヒューム用保護マスクを必ず着用します		
21. 作業後は板設備を必ず元に戻します		65. ガスボンベの転倒防止対策を必ず行います		
22. 壁つなぎ、筋かいは勝手に外さず、作業後は復元します		66. 火災作業後は必ず防火確認を行います		
23. 足場上では近道行為は絶対しません		67. サンダーのカバーは付けたまま作業します		
24. 安全設備を勝手に外しません		68. 漏電遮断機のテストを必ず行います		
25. 資材で安全通路をふさぎません		電動 工具	69. 電工ドラムは巻き取ったまま使用しません	
26. 足場の組立解体時は2丁掛けJIS型安全帯を使います			70. 本設電線にはビリビリガードを使います	
27. 作業通路を必ず通行します	71. 三芯・二重絶縁の工具を必ず使います			
28. 必ず昇降設備を使って昇降します	72. 丸のこは保護カバーを付けて作業します			
29. 高所作業車上で必ず安全帯を使います	73. モルタルミキサーには必ずカバーを設置します			
30. 高所作業車の後ろはコーンで表示します	74. 研り作業は集塵機を必ず使います			
31. 高所作業車の手すりには絶対寄りません	75. 研り片が飛び散らない様、周囲を養生します			
32. 高所作業車に挟まれ防止の支柱を設置します	76. 切手袋を必ず使います			
33. 高所作業車使用時は床段差、開口を確認します	77. カッター使用時はガード定期を使います			
34. 高所作業車の安全装置を取り外しません	員振 動工 機		78. ビットに入る前は回転速度を測定します	
35. 高所作業車の外に身を乗り出ません		79. ビット内は送風機で換気します		
36. 高所作業車は上昇したまま移動しません		80. 体調が悪い時は必ず報告します		
37. 高所作業車の降降時は作業かごを降ろし、鍵を抜きます		81. 長尺物の運搬は二人一組で行います		
38. 高所作業車の用途外使用は絶対しません		82. 開口部は責任をもって養生します		
39. 立馬の手掛かり棒を必ず使います		83. 溶接作業は絶対しません		
40. 立馬は必ず水平に設置します		84. 飛散物は必ず結実します		
41. 物を持ったまま立馬の昇降はしません		85. 軽体・解体工事期間は踏み抜きインソールを使います		
42. 立馬を開閉口開けでは使用しません		86. 有機溶剤使用中と溶接作業時は必ず換気します		
43. 立馬上では無理な姿勢で作業しません		その他	87. 現場の特徴や状況に合わせたリストを別紙活用します	
44. オアガ外観修繕は爪を降ろし、鎖止め設置し、鍵を抜きます	88. 本人の自由です			

決心せよ！今日一日の無災害


四国支店 建築部

「88の誓い」で必ず守ります！！私の安全宣言



ヘルメットに表示

毎朝自分が守ると決めた
安全宣言を直筆で記入！
リスト以外にも自由に
設定してOK👍

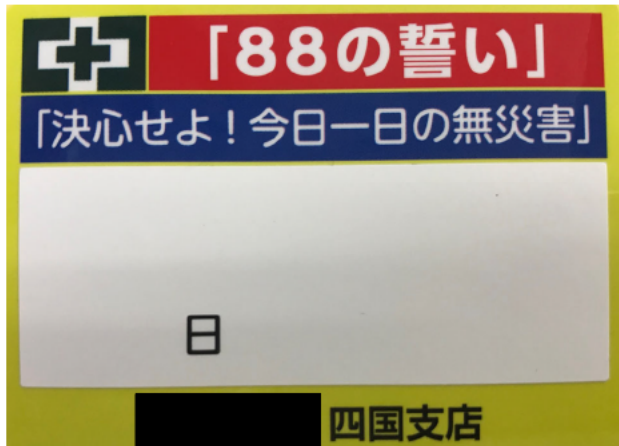

88のステッカー

日にちと宣言を記入する
シールは毎日貼替える
TBMでお互い確認！！

「88の誓い」リスト

一声をかけて摘み取る危険の芽 「起こる前に怒れ!!!」

IX. その他の危険有害性情報の「見える化」
