

施工計画図-3





養生  
床：プラスチック @0.15mm 2重  
壁：プラスチック @0.10mm 1重

単管にて作業床設置  
親車管@900  
転ばし@900

負圧機  
HEPAフィルター内蔵

看板等設置  
立入禁止表示看板の設置  
石綿除去作業中であることを表示  
事前調査結果の概要の掲示

セキュリティルーム  
I73747、真空掃除機設置

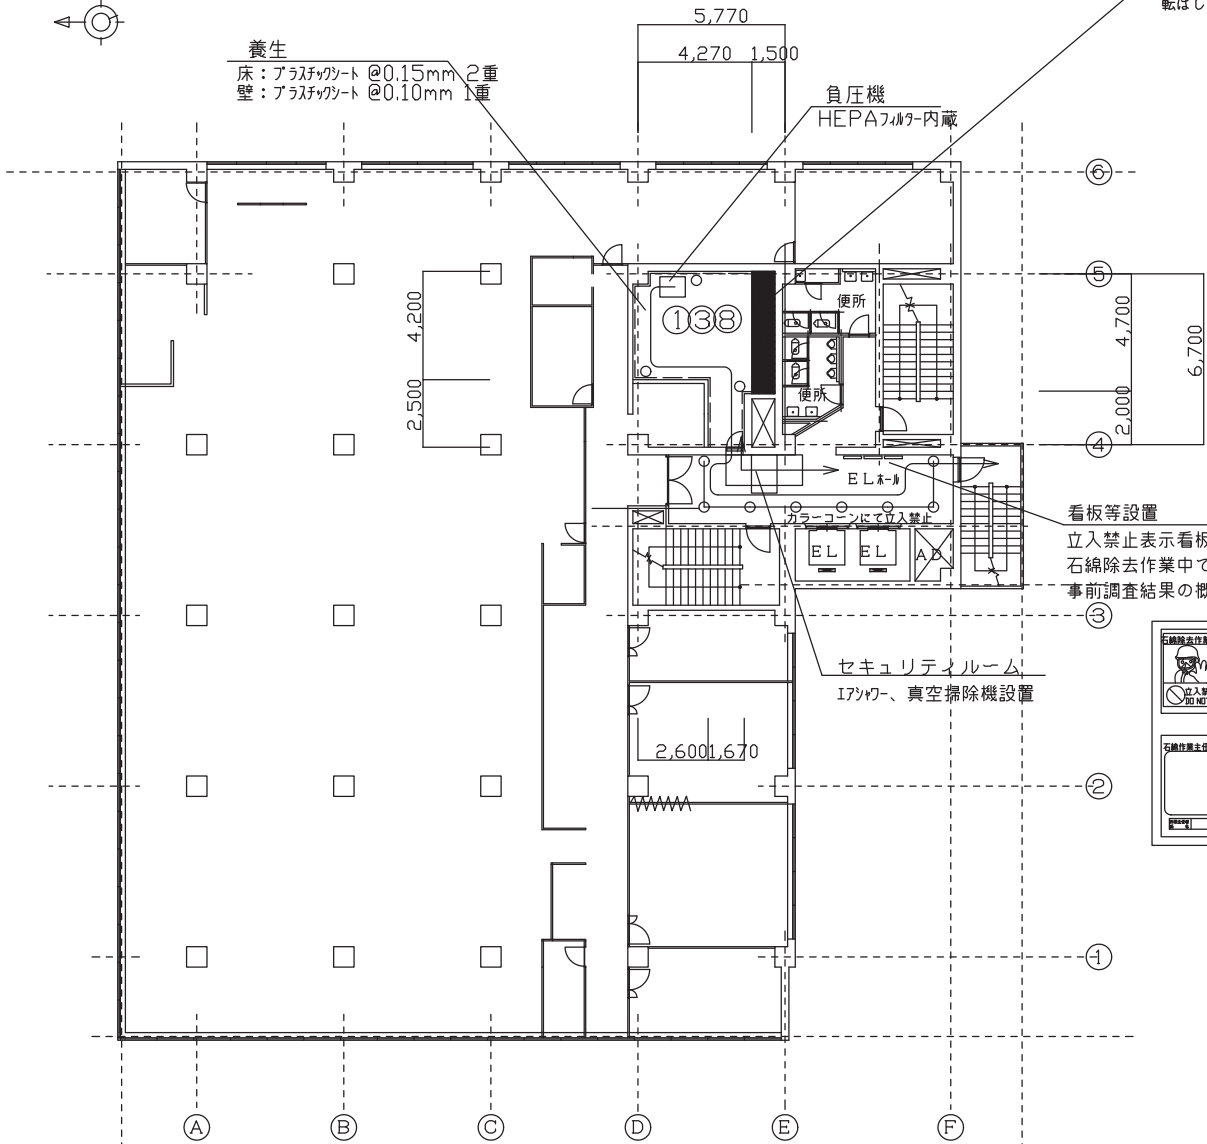

8階計画平面図

S=1/200

作業手順及び凡例等

凡例

	石綿使用部分除去範囲：天井
	隔離養生範囲
	石綿使用部分除去範囲：壁
	照明設備

環境測定箇所

作業状況	測定名称	測定場所
処理作業前	測定 ①	処理作業室内(石綿予防規則)
	測定 ②	隣地境界線(北)(測定計画図参照)
処理作業中	測定 ③	処理作業室内(石綿予防規則)
	測定 ④	隣地境界線(北)(測定計画図参照)
	測定 ⑤	隣地境界線(東)(測定計画図参照)
	測定 ⑥	隣地境界線(西)(測定計画図参照)
	測定 ⑦	隣地境界線(南)(測定計画図参照)
養生撤去前	測定 ⑧	処理作業室内(石綿予防規則)
養生撤去後	測定 ⑨	隣地境界線(北)(測定計画図参照)

負圧換気計画

1時間当たりの負圧機的能力 $56 \text{ m}^3/\text{min} \times 60 \text{ min} = 3360 \text{ m}^3/\text{h}$
隔離養生内の容積 $5.77 \text{ m} \times 6.70 \text{ m} \times 3.22 \text{ m} = 124.48 \text{ m}^3$ $1.20 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 2.00 \text{ m} = 7.20 \text{ m}^3$ 容積合計 $131.68 \text{ m}^3$
負圧じん装置の能力×台数(台数換算) 換気量 $3360 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ 台} = 3360 \text{ m}^3/\text{h}$ 容積合計 $131.68 \text{ m}^3$ 上記の式の結果 $25.5 \text{ 回}/\text{h}$ 1時間当たりの換気回数が4回以上である。 負圧じん装置台数は 1 台

工事用電力(7階EVホール内の分電盤を使用する)  
照明用電力は既設建物の電力を使用  
照明器具は3台設置、作業ごとに位置を移動  
コード等、石綿粉じんにさらされる可能性がある箇所  
プラスチックにて養生(1重)を施す。

訂正	年月日

工事名称		図面番号
図面名称	8階計画平面図	
